



Projet S2

Plan projet.


Sommaire

I - Analyse organique du produit


- <u>A) PBS</u>
- \rightarrow Voir PBS.pdf
 - B) RBS
- → Voir RBS.pdf
 - C) WBS
- → Voir WBS.pdf


II - Planning

- A) Gantt
- → Voir GANTT.pdf
 - B) PERT
- → Voir PERT.pdf

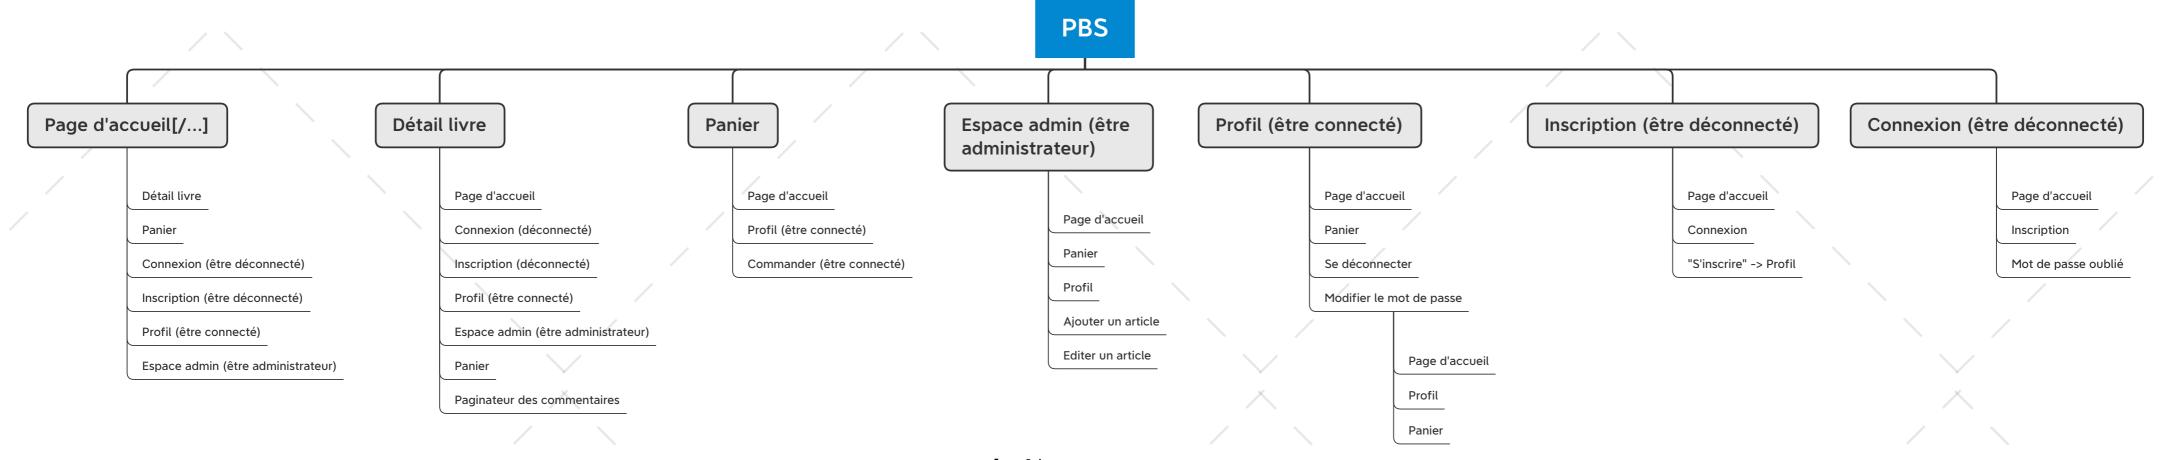

XMind | Mode d'Evaluation

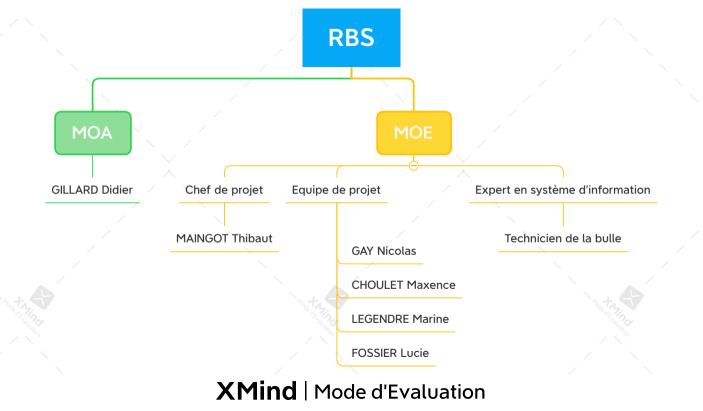

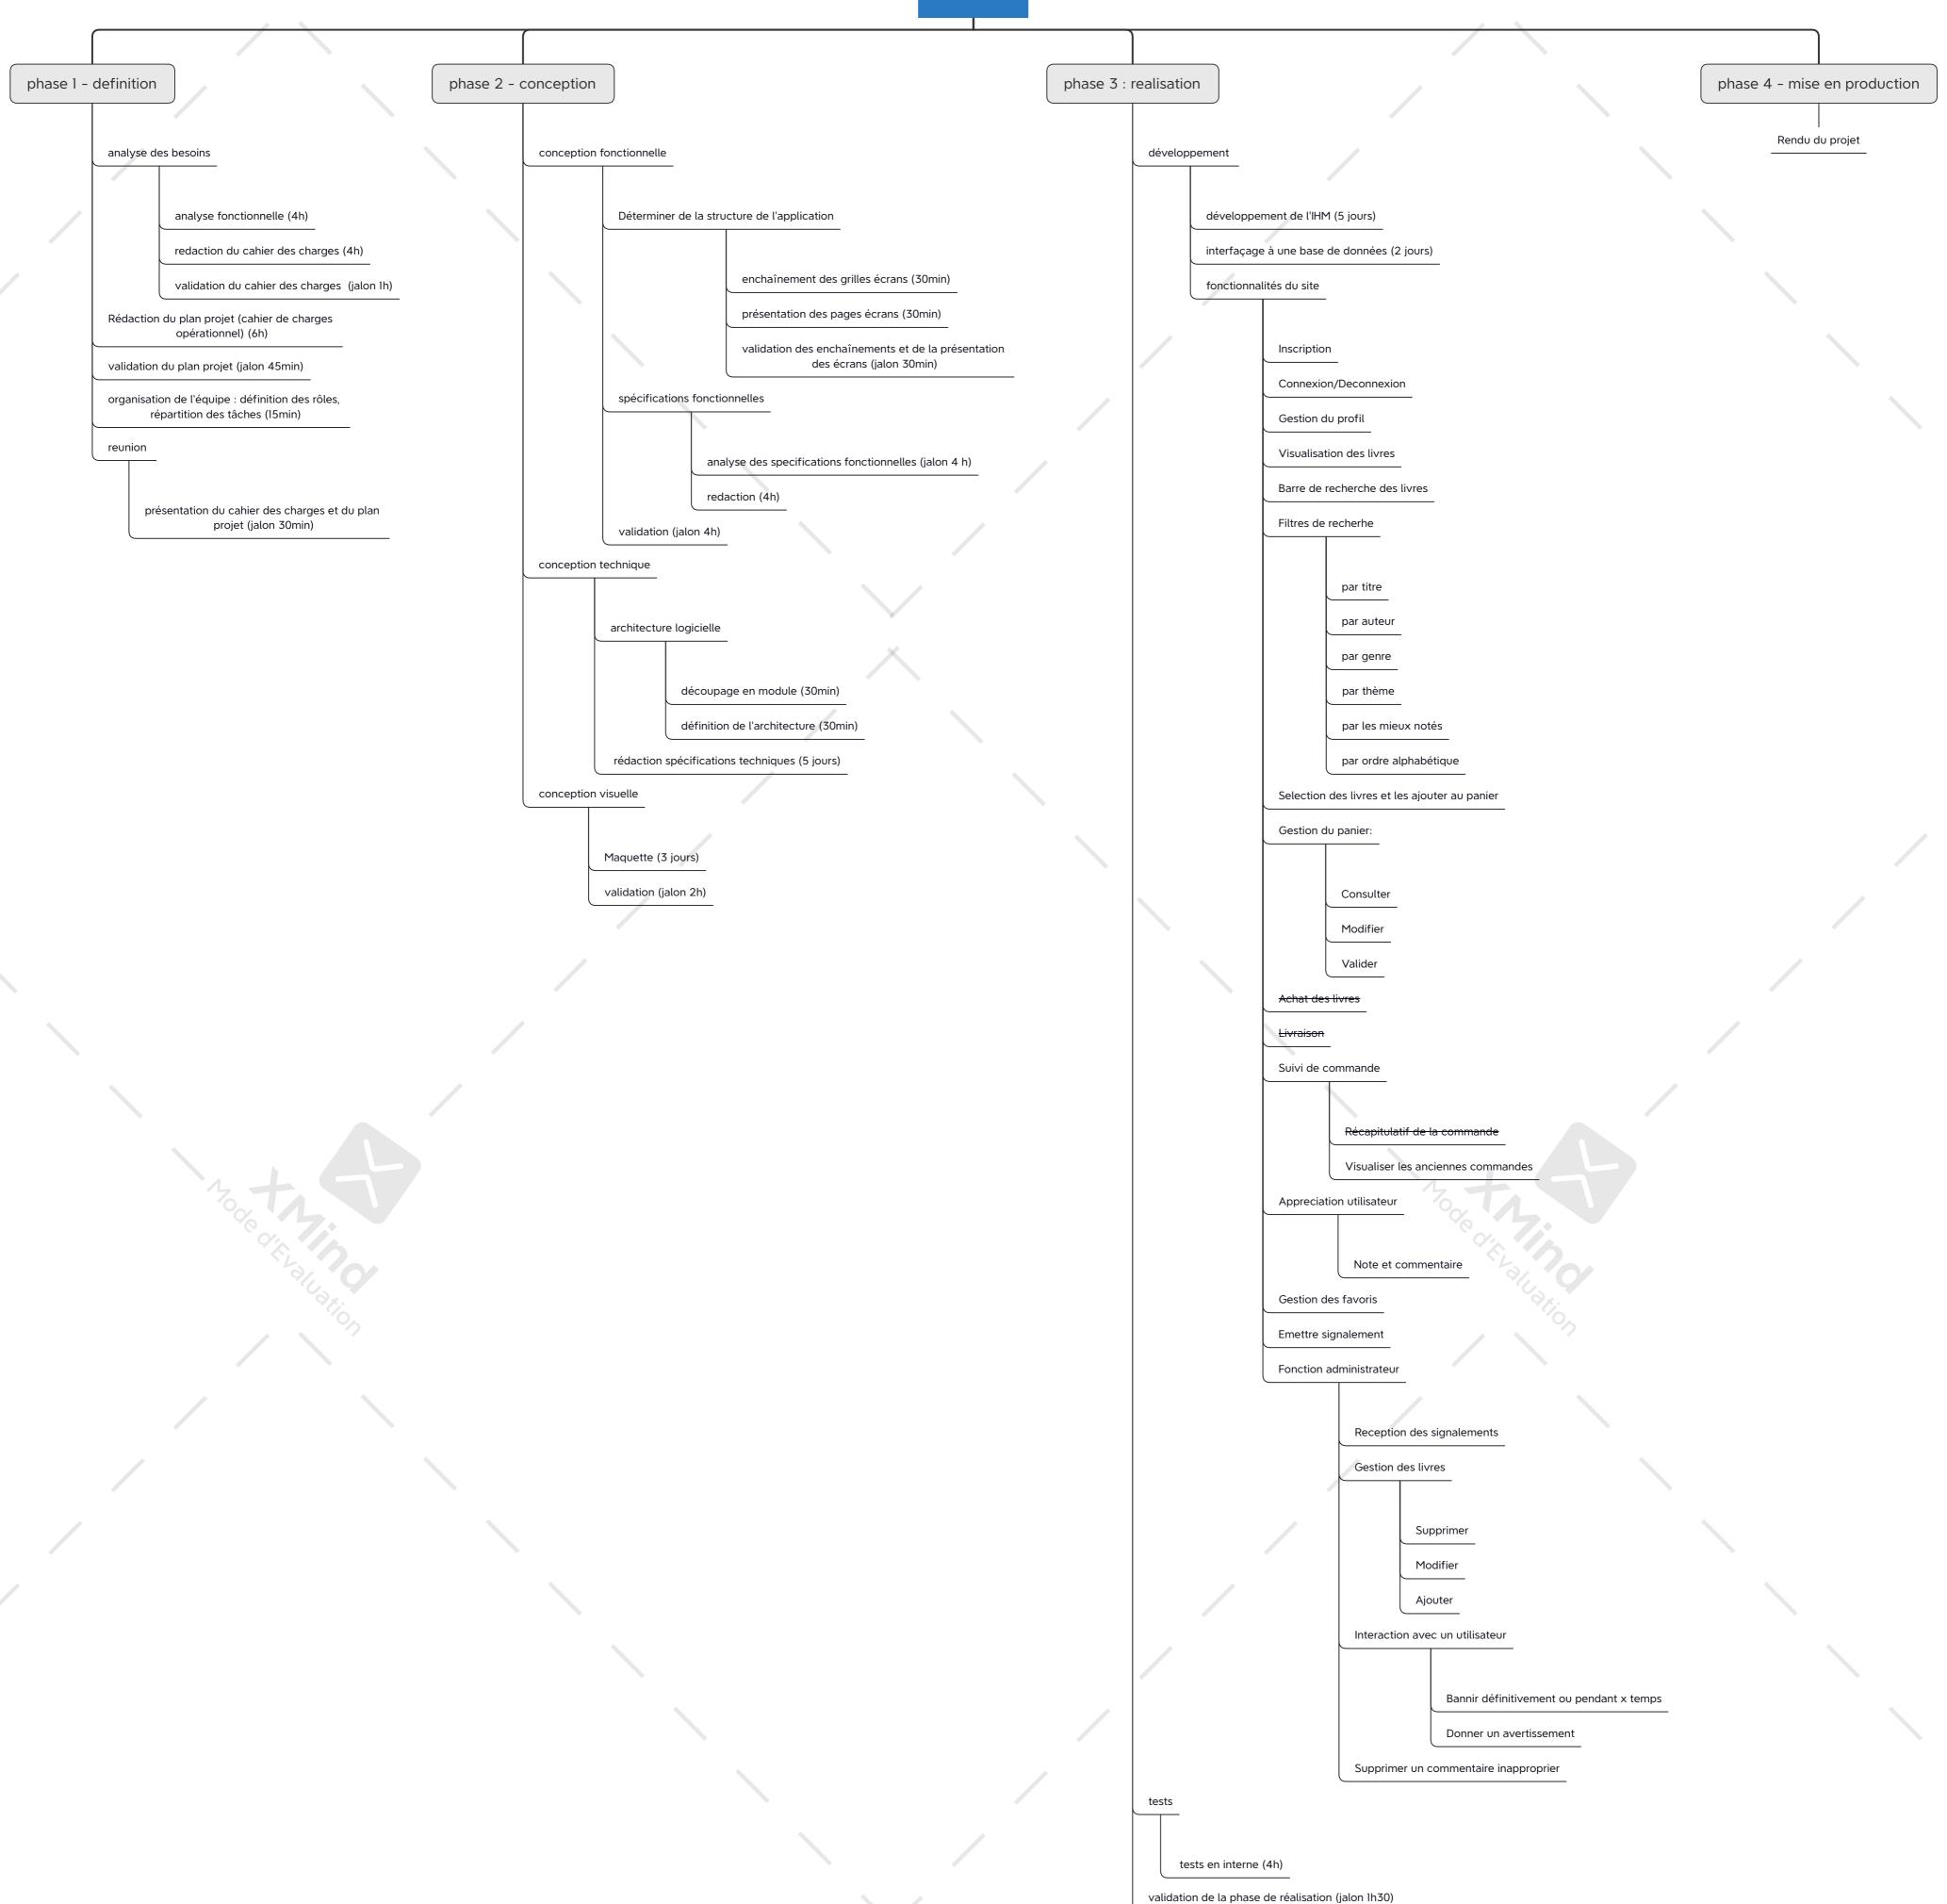

Cher de projet
Dates du proje

Ohaf da maiat

MAINGOT Thibaut 31 mai 2021 - 10 juin 2021

Avancée

0%

Tâches Ressources 20

31 mai 2021

Validation de la phase de réalisation

âches				
Nom	Date de début	Date de fin		
Analyse des besoins	31/05/2021	31/05/2021		
Redaction du cahier des charges	01/06/2021	01/06/2021		
Validation du cahier des charges	02/06/2021	02/06/2021		
Rédaction du plan projet	02/06/2021	02/06/2021		
Organisation de l'équipe	02/06/2021	02/06/2021		
Validation du plan projet	03/06/2021	03/06/2021		
Enchaînement des grilles écrans	03/06/2021	03/06/2021		
Présentation des pages écrans	03/06/2021	03/06/2021		
Validation des enchaînements et de la présentation des écrans	04/06/2021	04/06/2021		
Analyse des spécification fonctionnelles	03/06/2021	03/06/2021		
Rédaction des specifications fonctionnelles	04/06/2021	04/06/2021		
Architecture logicielle	03/06/2021	03/06/2021		
Maquette	03/06/2021	04/06/2021		
Validation de la conception visuelle et des spécifications techniques	07/06/2021	07/06/2021		
Herbergement du site	07/06/2021	07/06/2021		
Développement de l'IHM	07/06/2021	08/06/2021		
Interfaçage à une base de données	07/06/2021	07/06/2021		
Fonctionnalitées du site	07/06/2021	08/06/2021		
Tests en interne	09/06/2021	09/06/2021		

10/06/2021

10/06/2021

Rôle par défaut Chef de projet

Développeur

Développeur Développeur

Développeur

Non défini Non défini

GAY Nicolas

CHOULET Maxence

LEGENDRE Marine FOSSIER Lucie


Technicien de la bulle

GILLARD Didier

Nom MAINGOT Thibaut

GANTT

Diagramme de Gantt

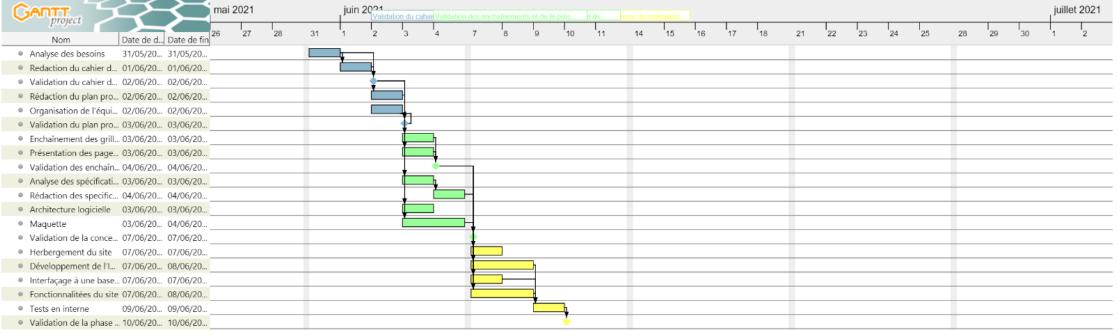

GANTT

Diagramme des Ressources



Préparation au diagramme de PERT

Tâche	Description	Prédécesseur	Durée
Α	Analyse des besoins	/	1
В	Rédaction du cahier des charges	А	1
С	Validation du cahier des charges	A, B	jalon
D	Rédaction du plan projet	С	1
Е	Organisation de l'équipe	F (FF)	1
F	Validation du plan projet	D	jalon
G	Enchaînement des grilles écrans	F	1
Н	Présentation des pages écrans	C, F	1
I	Validation des enchaînements et de la présentation des écrans	G, H	jalon
J	Analyse des spécifications fonctionnelles	C, F	1
K	Rédaction des spécifications fonctionnelles	J	1
L	Architecture logicielle	C, F	1
М	Maquette	C, F	2
N	Validation de la conception visuelle et des spécifications techniques	K, M	jalon
0	Hébergement du site	N	1
Р	Développement de l'IHM	I, N	2
Q	Interfaçage à une base de données	I, N	1
R	Programmation des fonctionnalités du site	I, N	2
S	Tests en interne	P, Q, R	1
Т	Validation de la phase de réalisation	S	jalon

Niveau	Tâche
1	A
2	В
3	C
4	D
5	F, E (F FF)
6	G, L, M, J, H
7	I, K
8	N
9	O,P,Q,R
10	S
11	Т

